



CITY BREAKFAST DU 19 JUIN 2019



RÉALISATION DE LA LIGNE B DE TRAMWAY A LUXEMBOURG



Lot 1 Etoile – Bd Royal

Place de l'Etoile : Déviation des réseaux de **mi-juin** à **fin juin**

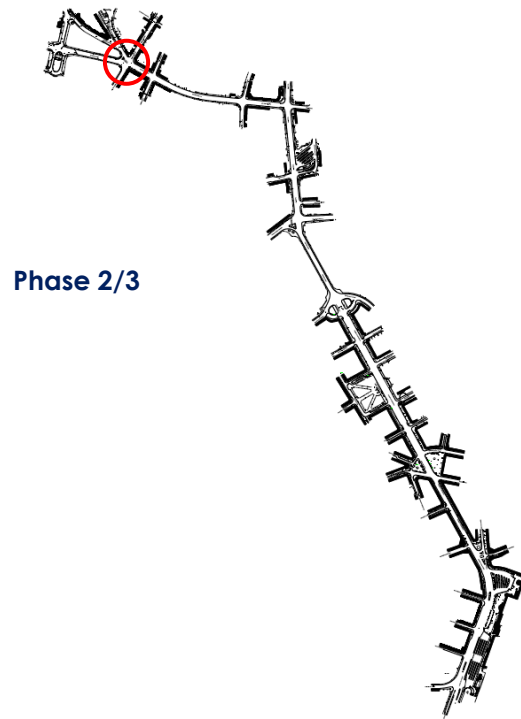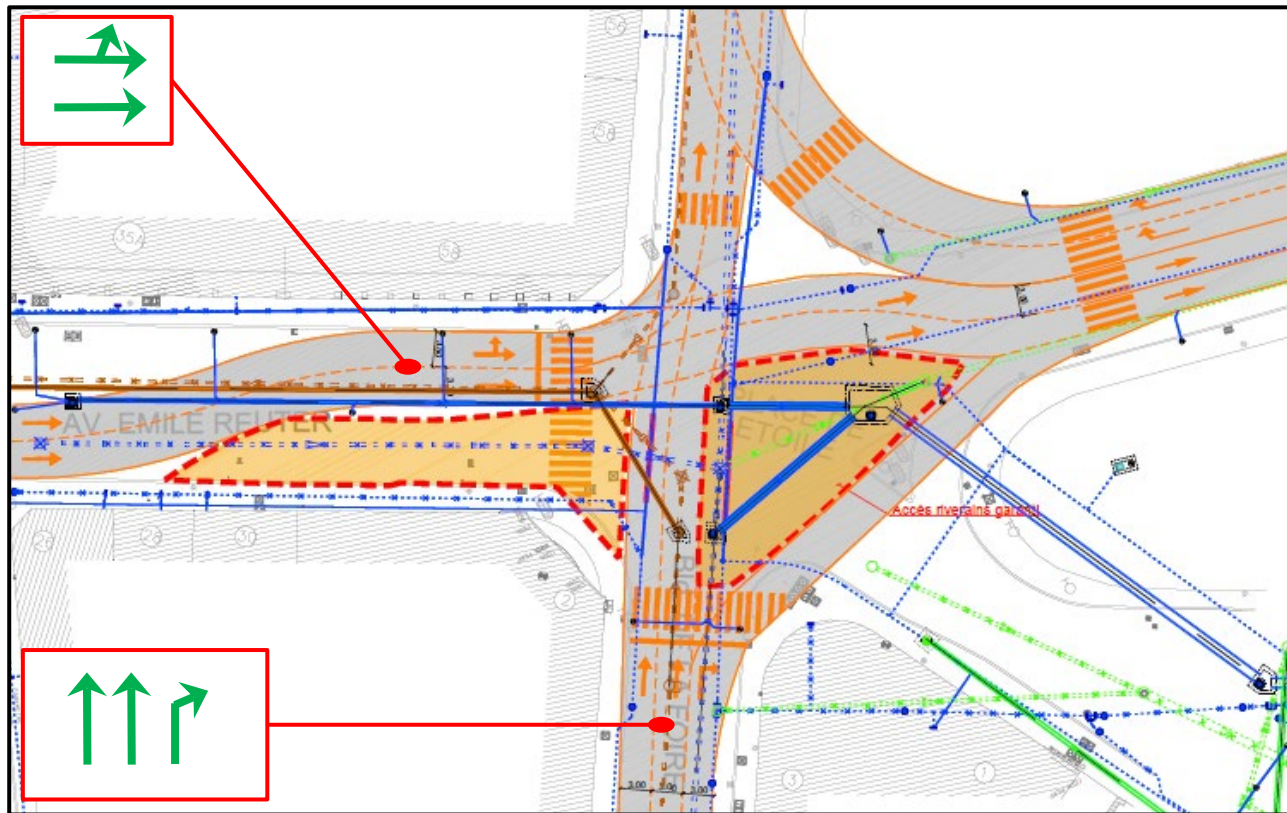


Lot 1 Etoile – Bd Royal

Place de l'Etoile : Déviation des réseaux de **début juillet** à **mi-juillet**

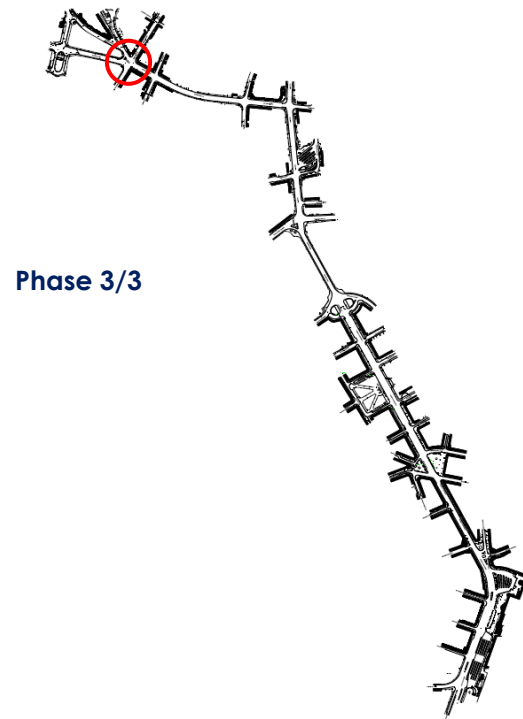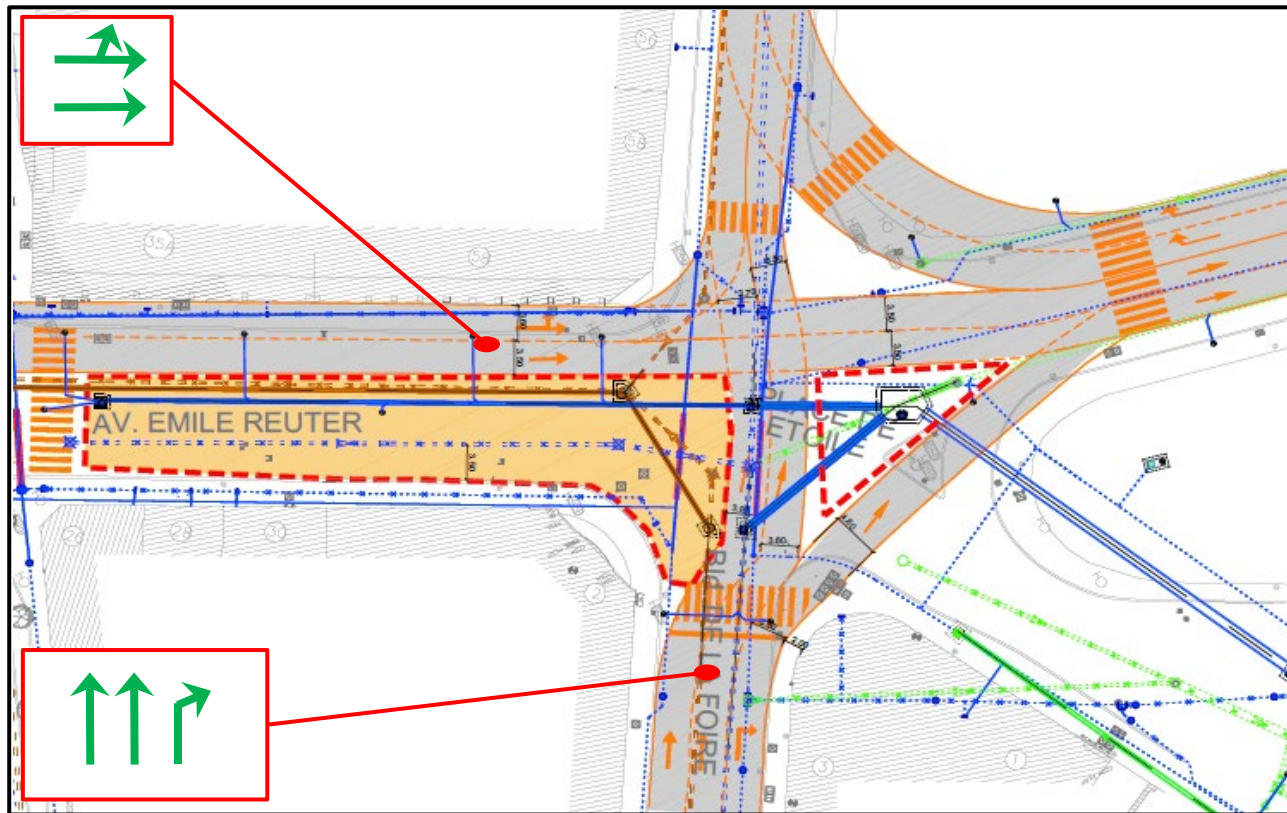


Phase 3/3

06 07 08 09

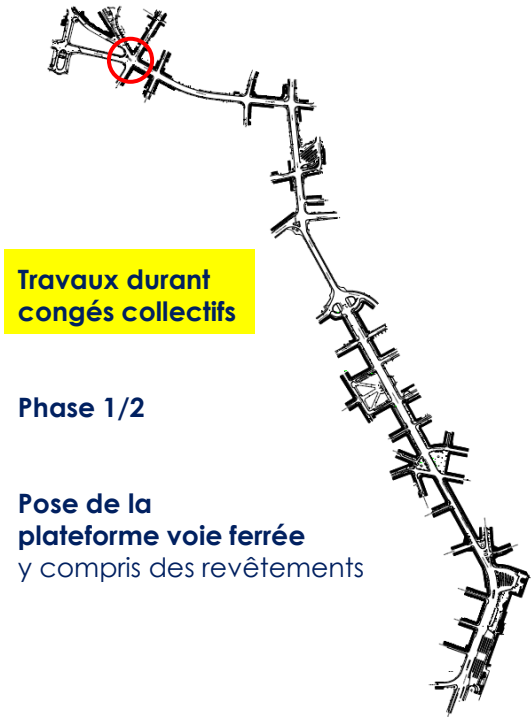

Lot 1 Etoile – Bd Royal

Place de l'Etoile : Plateforme Voie Ferrée de **mi-août** à **mi-septembre**

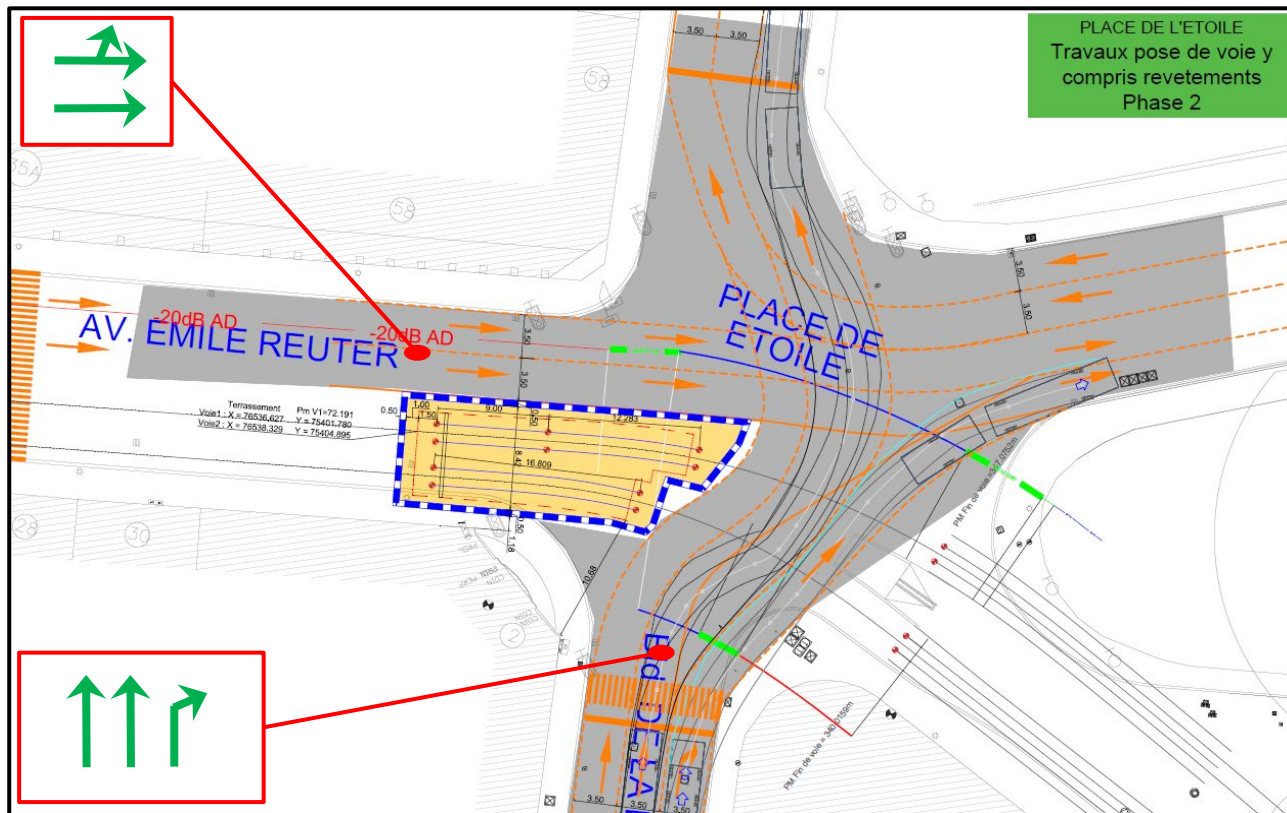



**Travaux durant
congés collectifs**

Phase 2/2

**Pose de la
plateforme voie ferrée
y compris des revêtements**



Lot 1 Etoile – Bd Royal

Bd Joseph II : Plateforme Voie Ferrée de **mi-juillet** à **fin août**

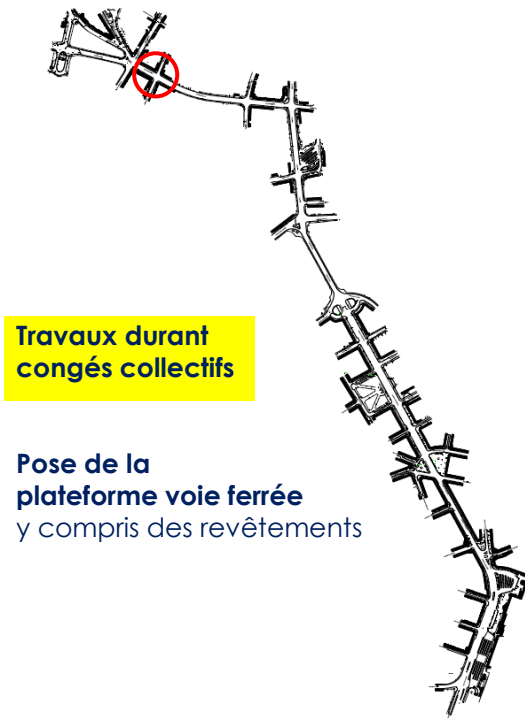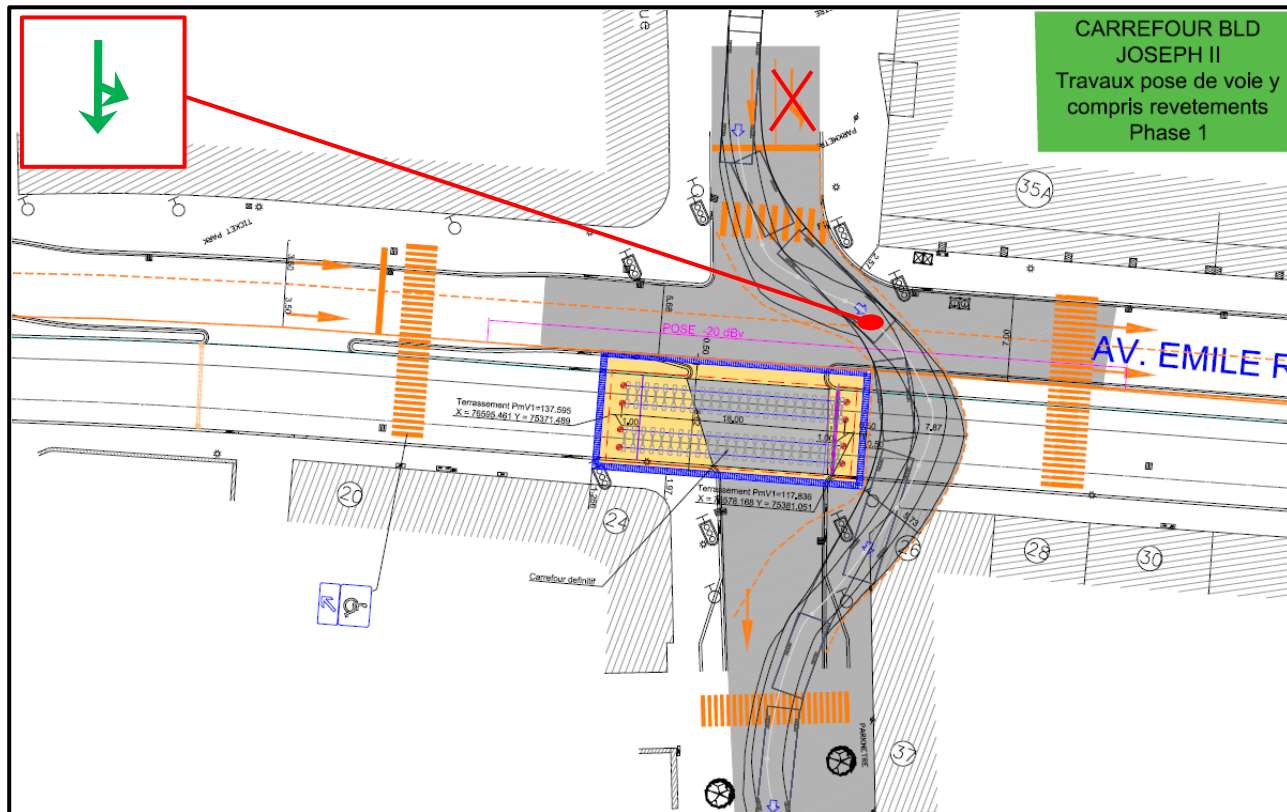

Lot 2 Bd Royal – Place de Bruxelles

Bd Royal / Emile Reuter : Déviation des réseaux de **mi-juillet** à **début août**

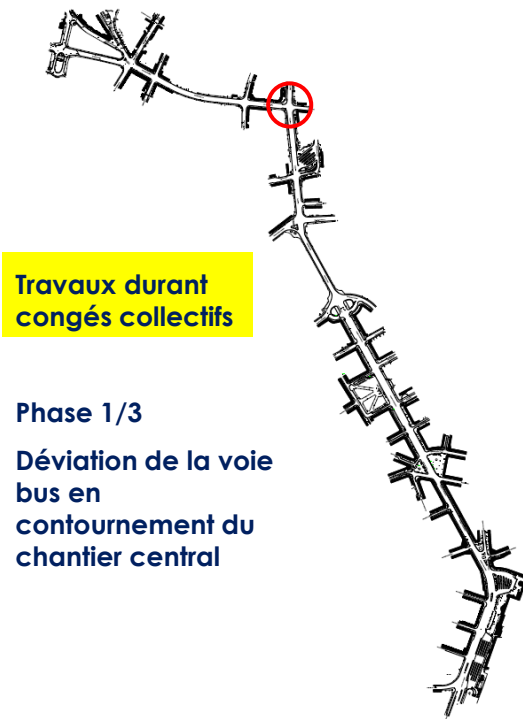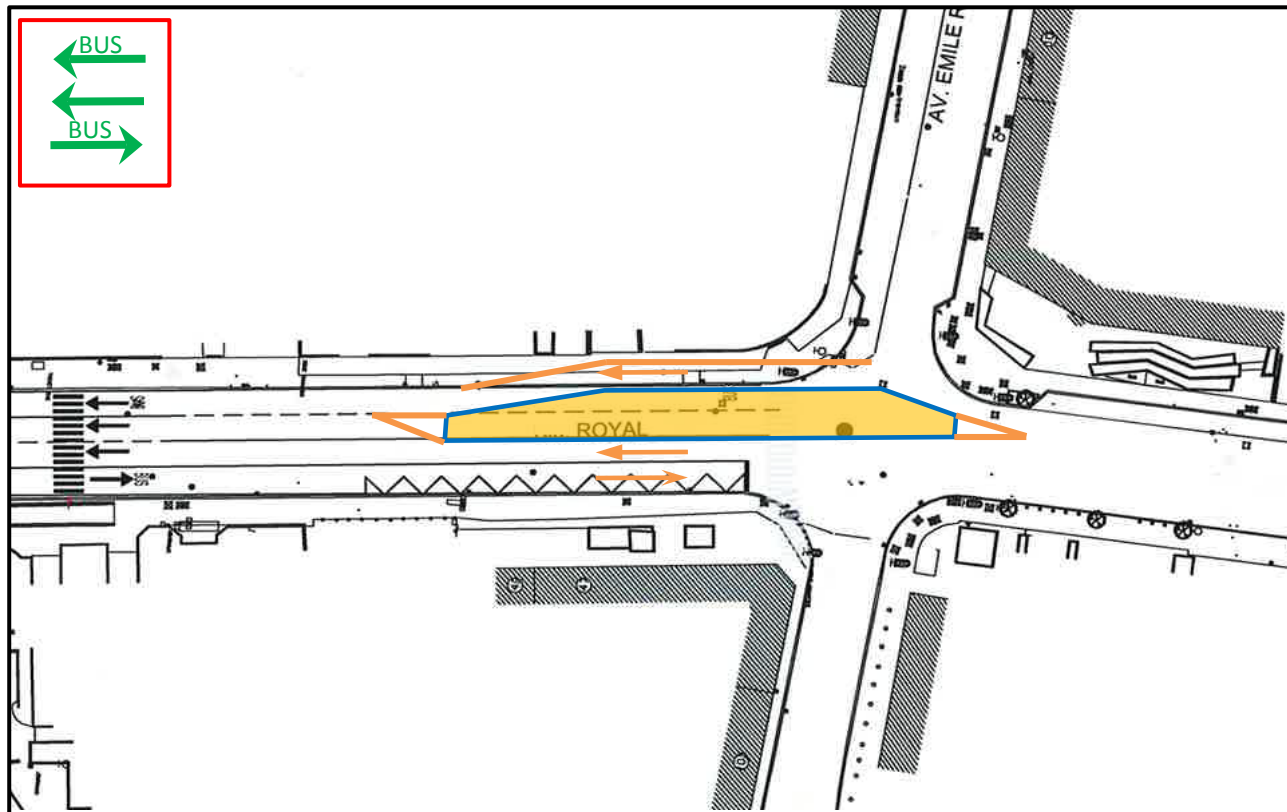



Travaux durant
congés collectifs

Phase 1/3

Déviation de la voie
bus en
contournement du
chantier central

Lot 2 Bd Royal – Place de Bruxelles

Bd Royal / Emile Reuter : Déviation des réseaux de **début août** à **mi-août**

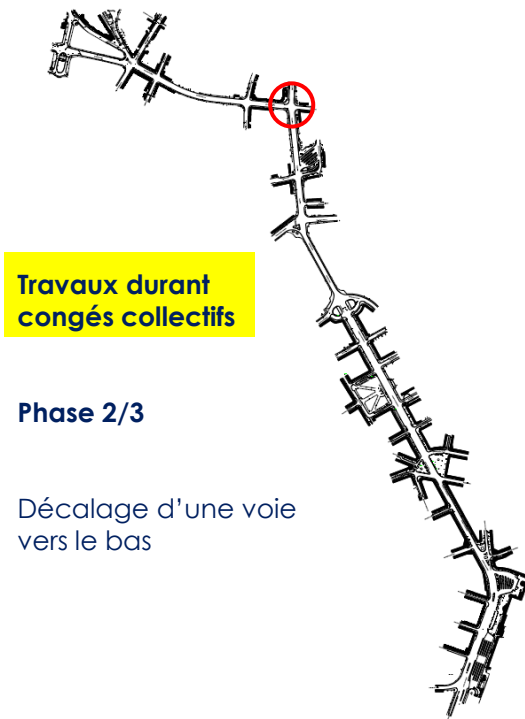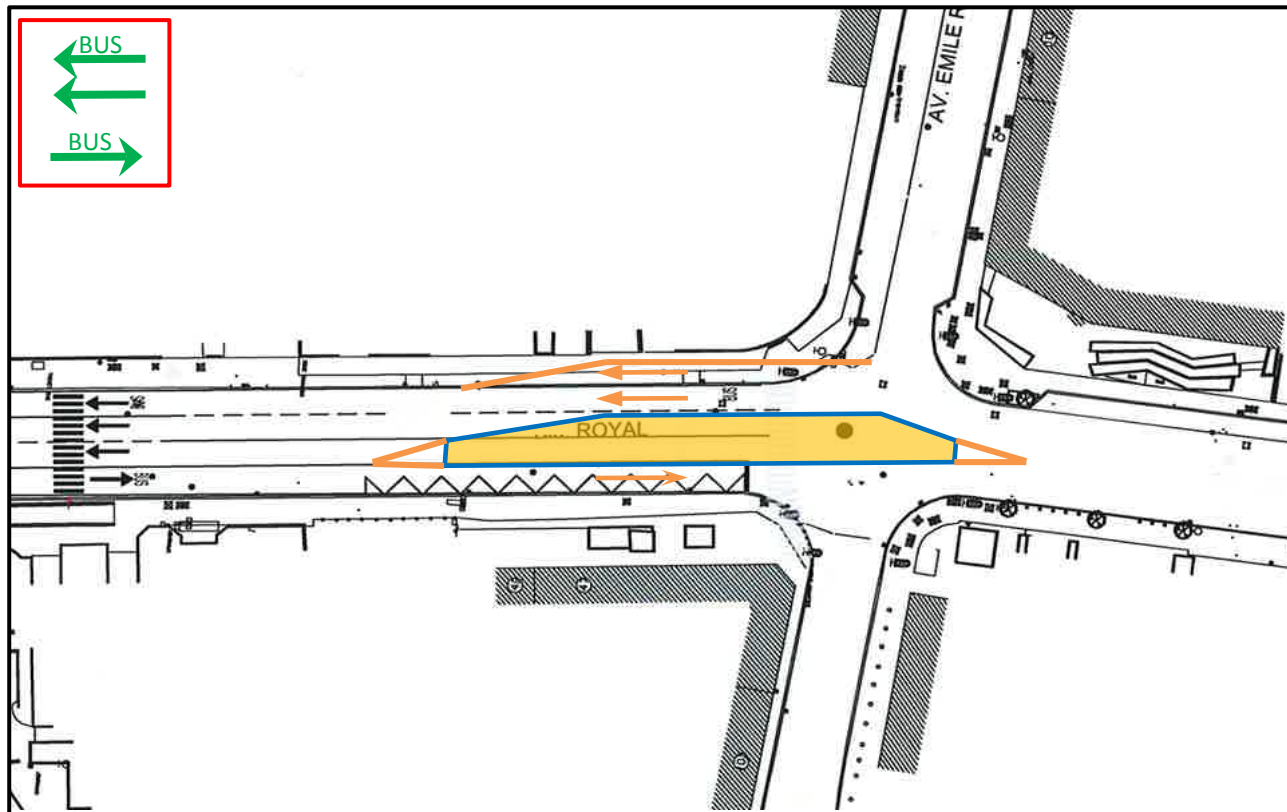



Travaux durant
congés collectifs

Phase 2/3

Décalage d'une voie
vers le bas

Lot 2 Bd Royal – Place de Bruxelles

Bd Royal / Emile Reuter : Déviation des réseaux de **mi-août** à **mi-septembre**

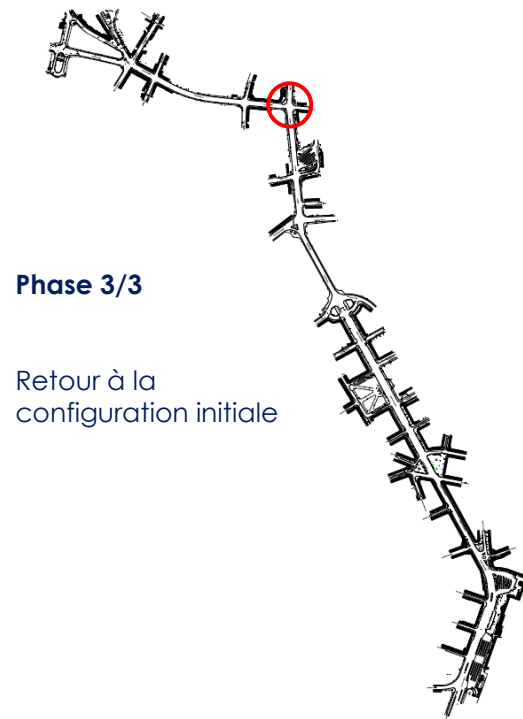
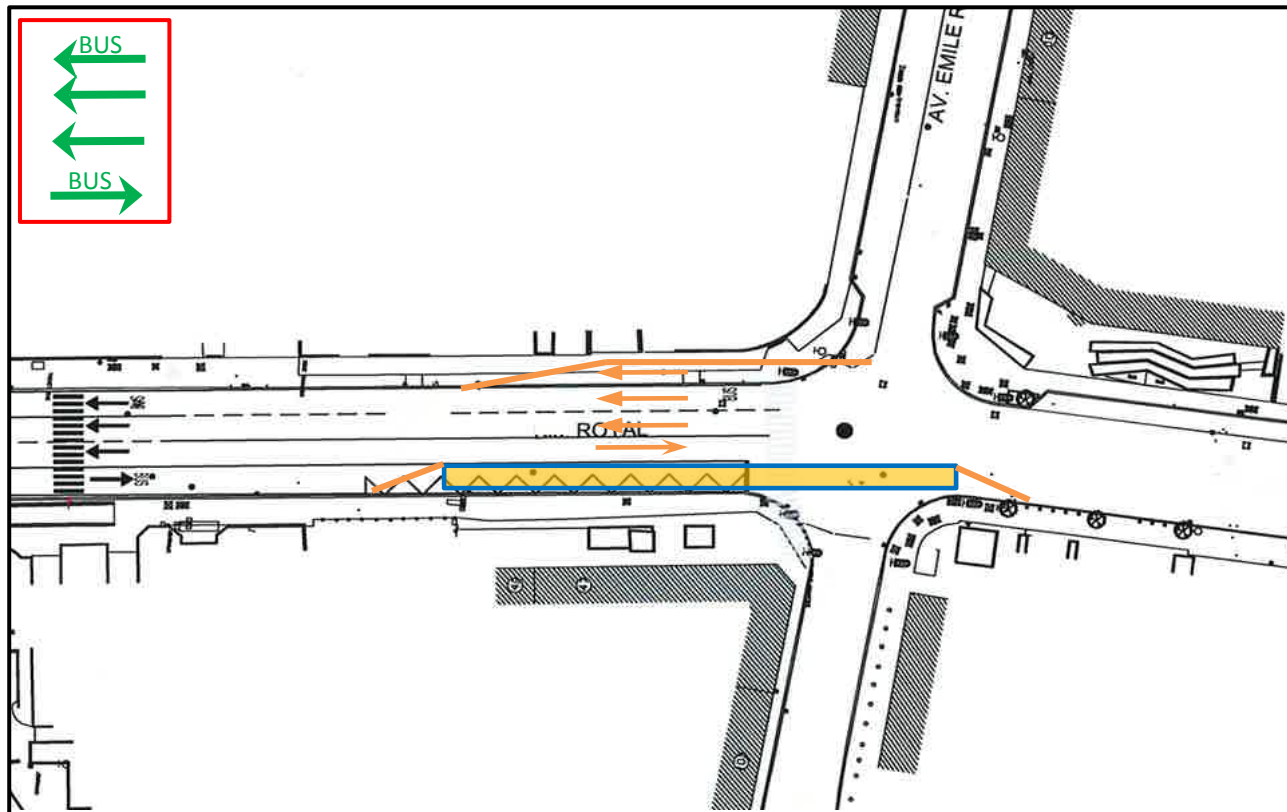


Phase 3/3

Retour à la
configuration initiale

Lot 2 Bd Royal – Place de Bruxelles

Bd Royal / « Royal-Hamilius » : Déviation des réseaux de mi-juin à fin juin

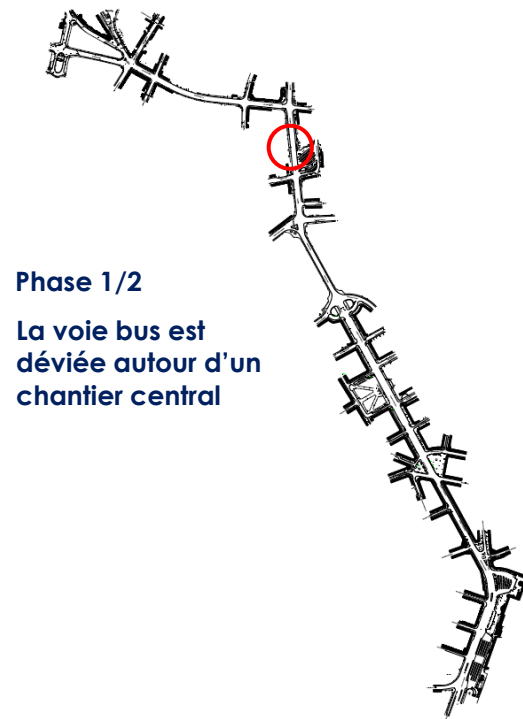
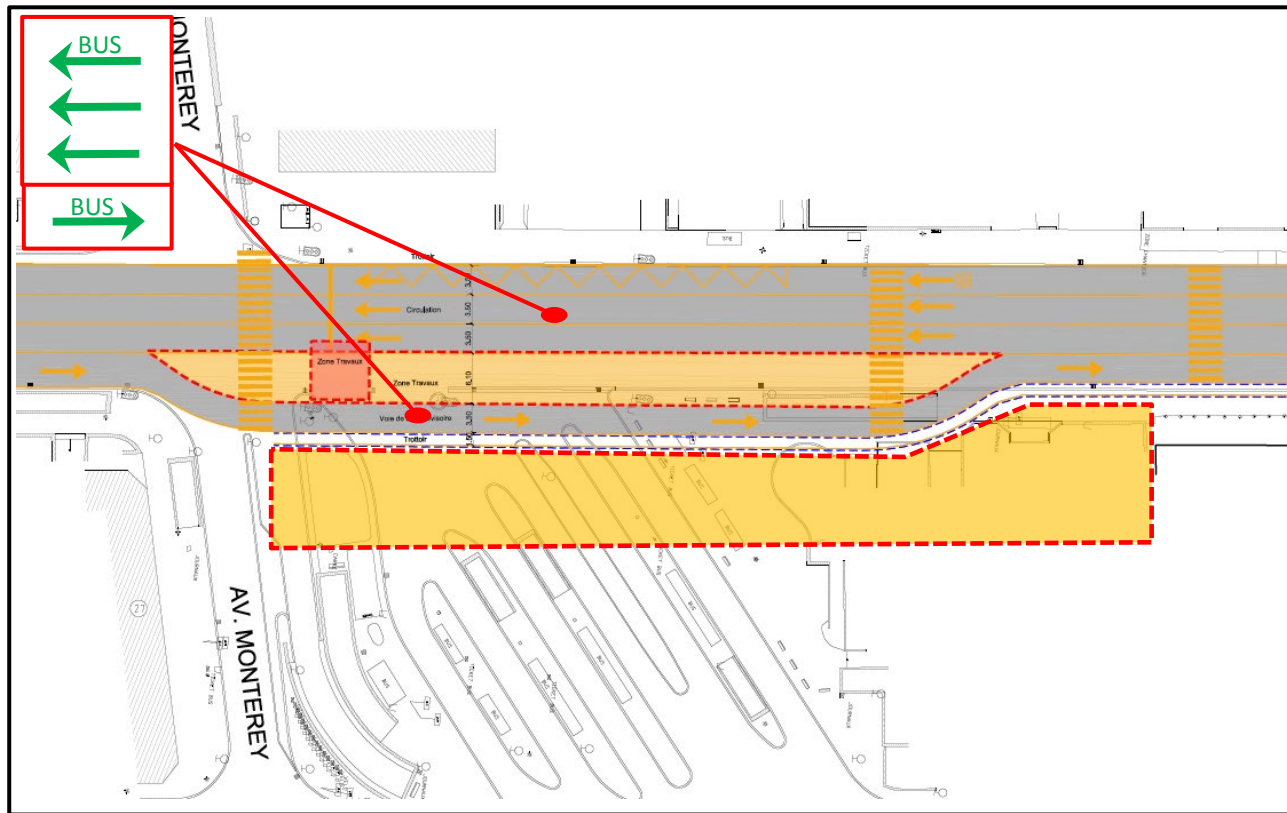


Phase 1/2

La voie bus est déviée autour d'un chantier central



Lot 2 Bd Royal – Place de Bruxelles

Bd Royal/«Royal-Hamilius» : Déviation des réseaux à partir de début juillet

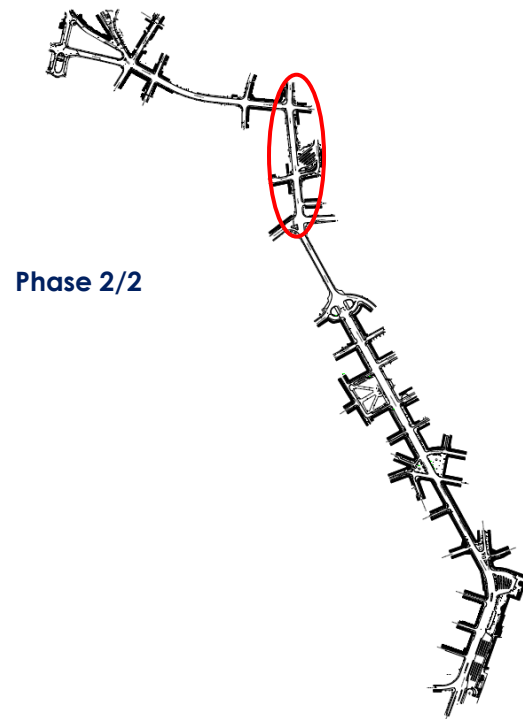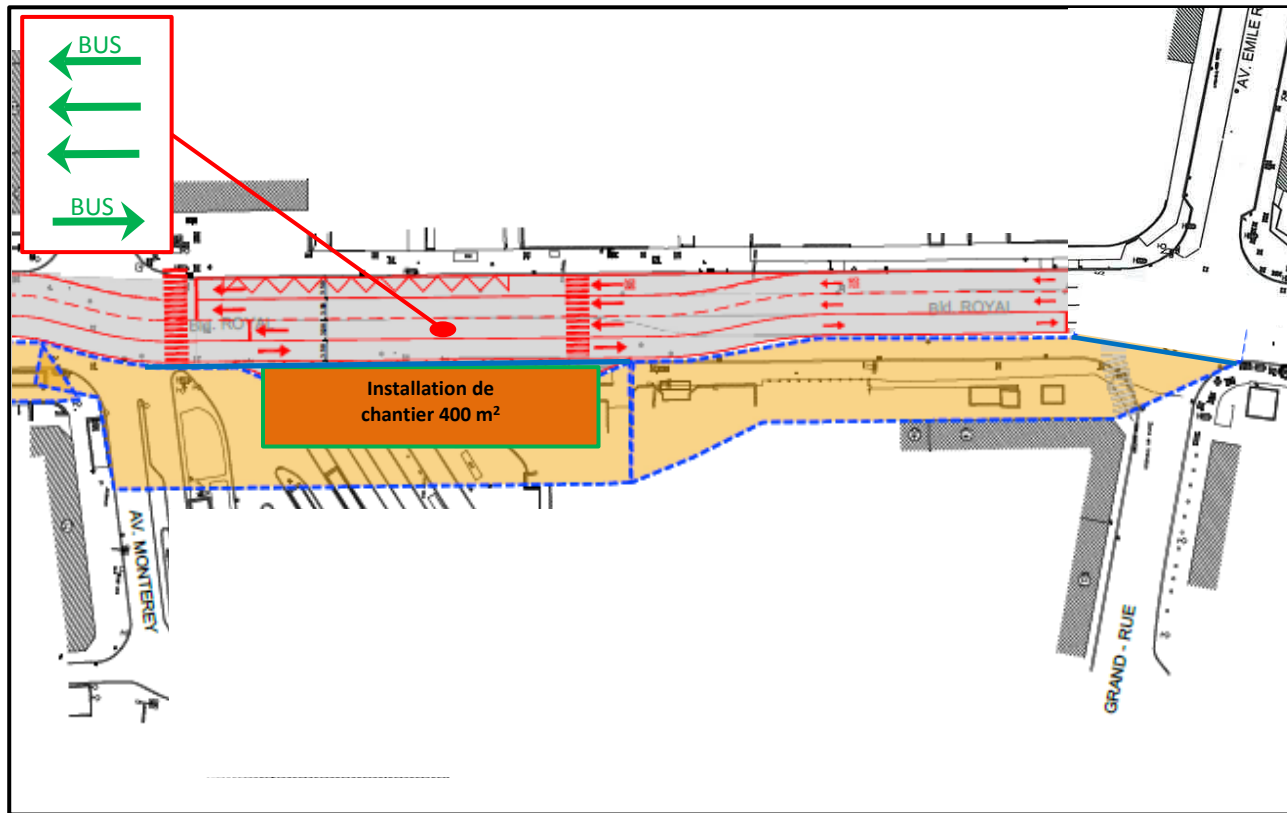




Lot 2 Bd Royal – Place de Bruxelles

Place de Bruxelles : Déviation des réseaux

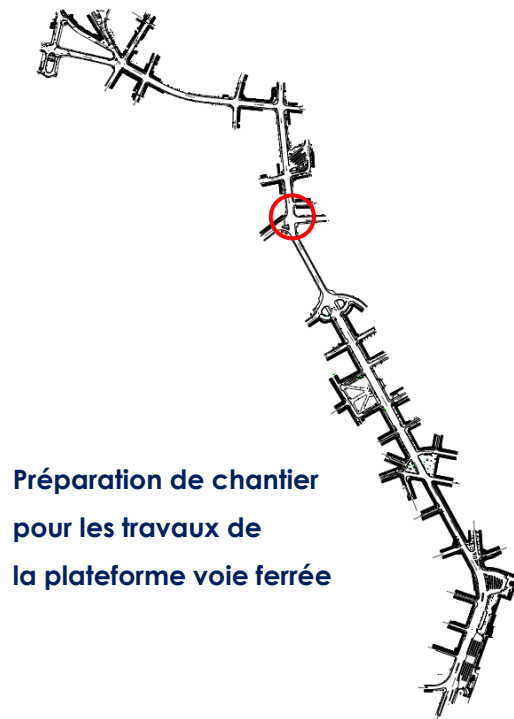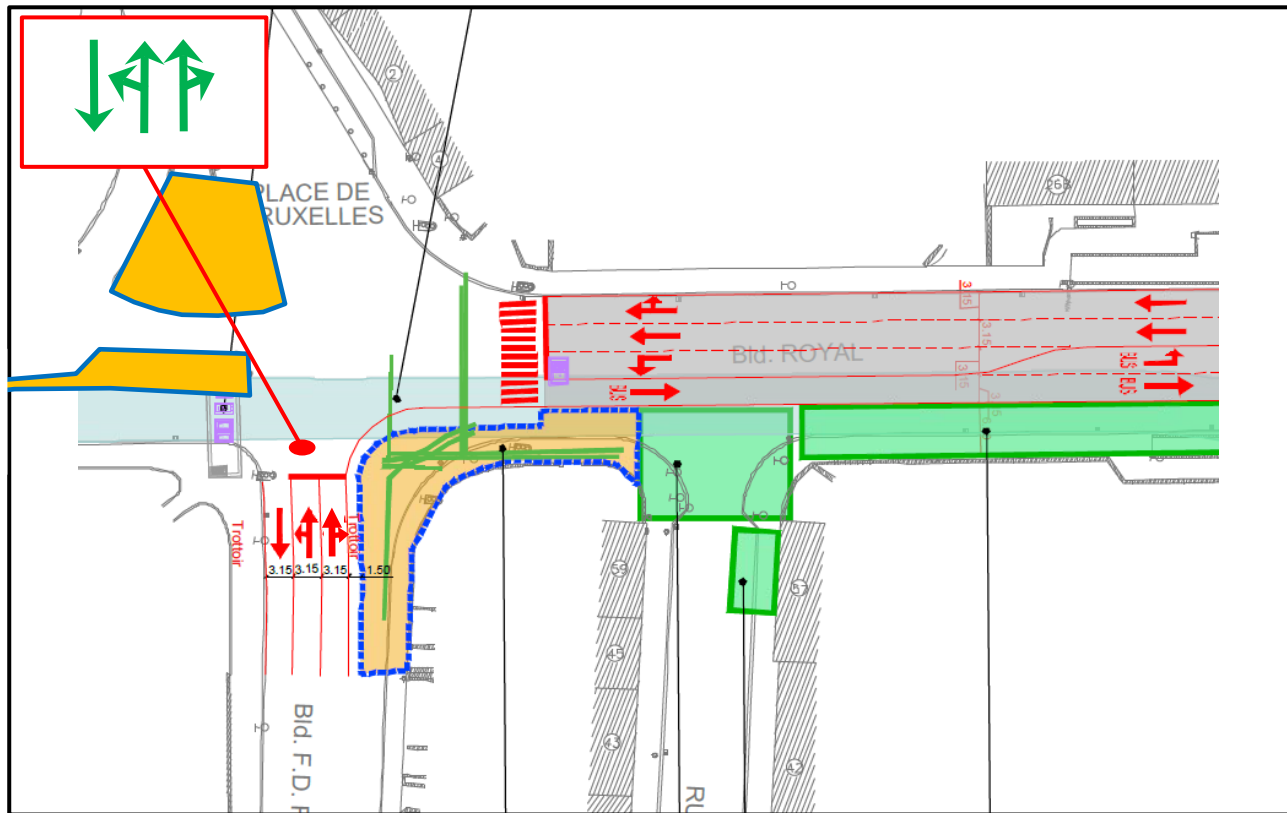

Préparation de chantier
pour les travaux de
la plateforme voie ferrée




Place de Bruxelles : Plateforme Voie Ferrée

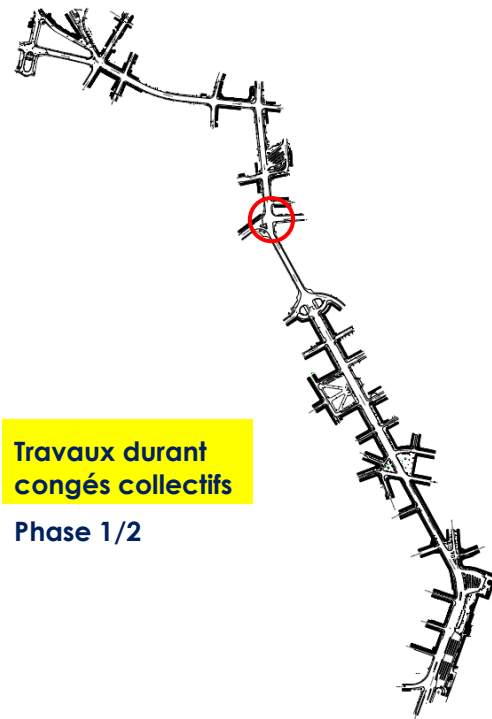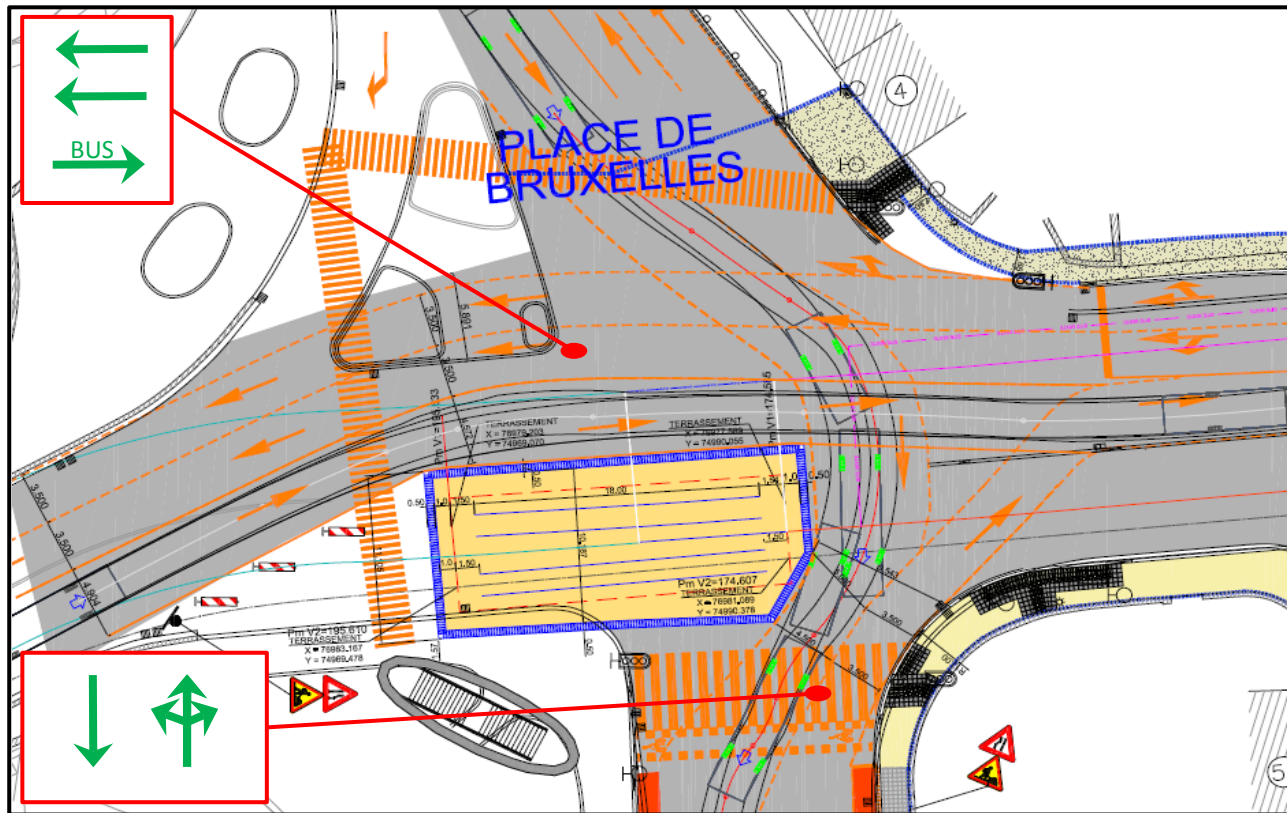

Travaux durant congés collectifs

Phase 1/2

Place de Bruxelles : Plateforme Voie Ferrée

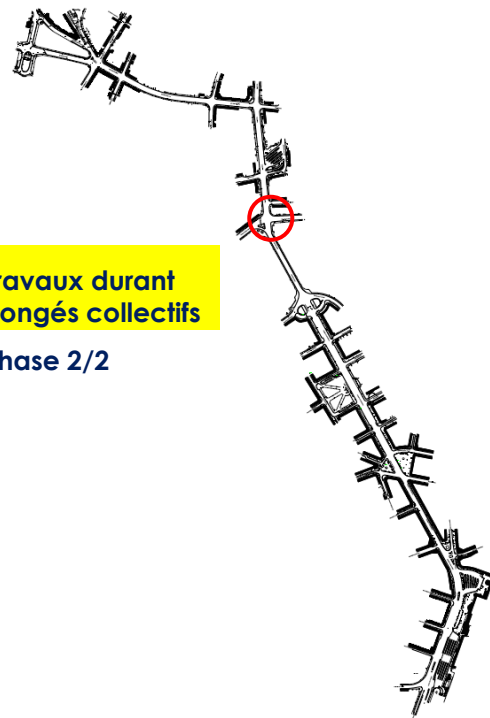

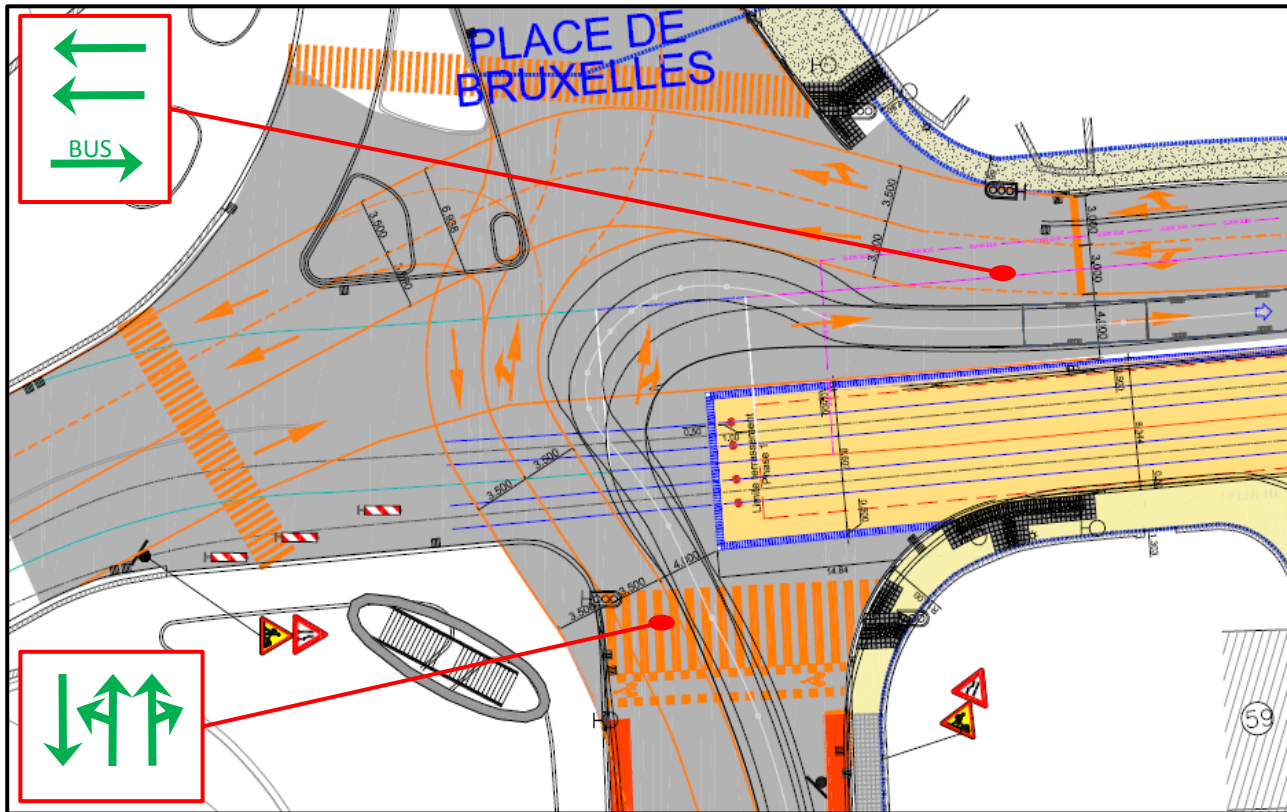


Travaux durant congés collectifs

Phase 2/2



Lot 3 Place de Metz – Place de Paris

Avenue de la Liberté : Déviation des réseaux (en cours)

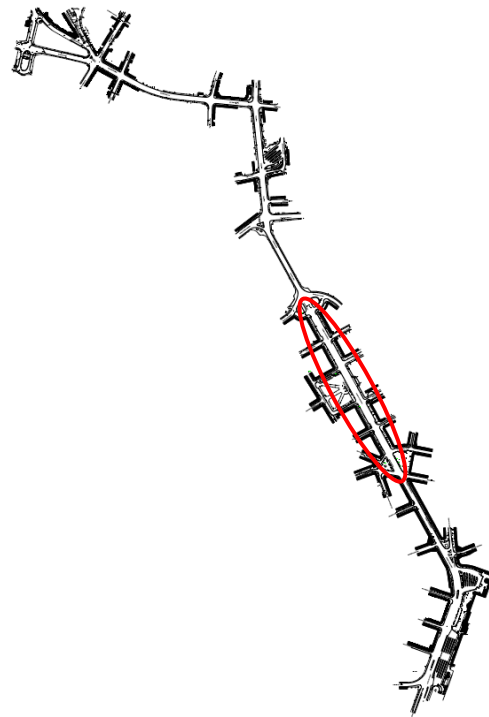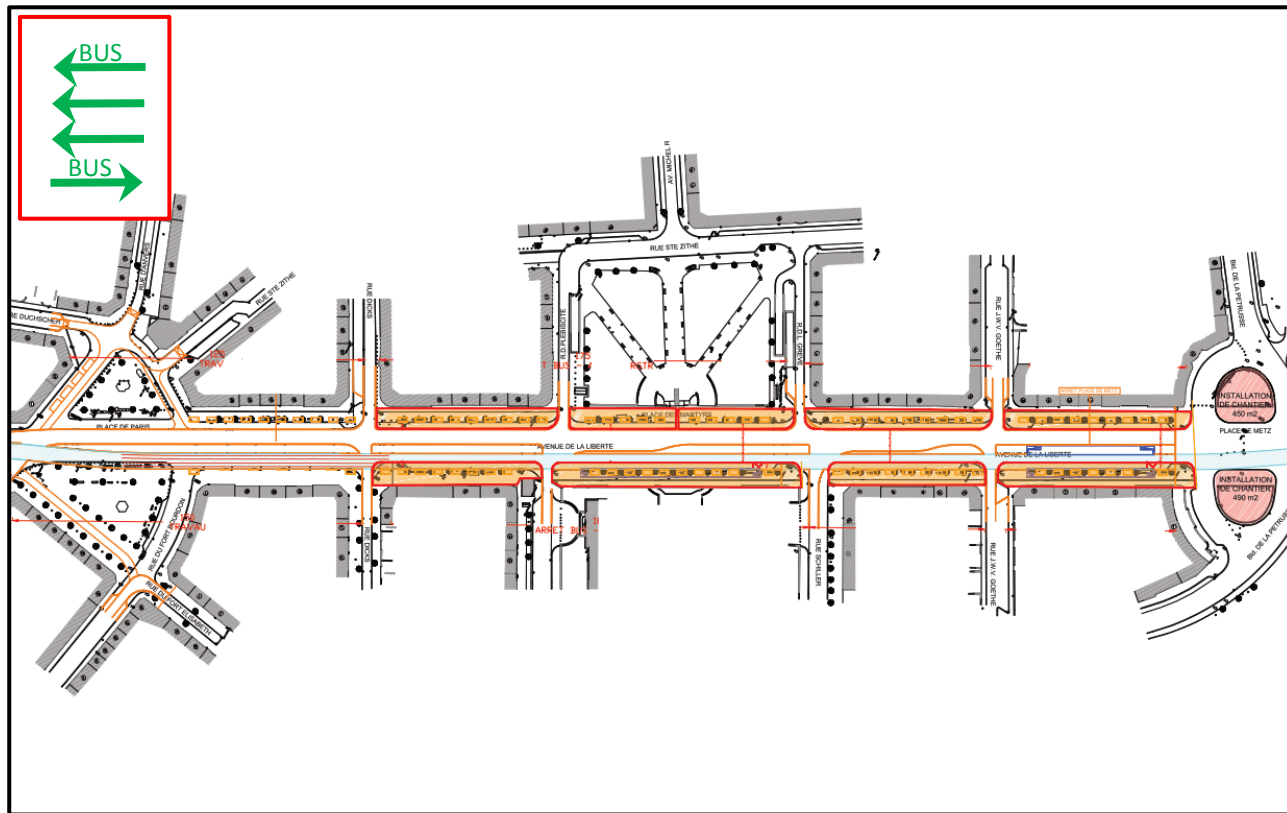



Lot 3 Place de Metz – Place de Paris

Avenue de la Liberté : Plateforme à partir de juillet

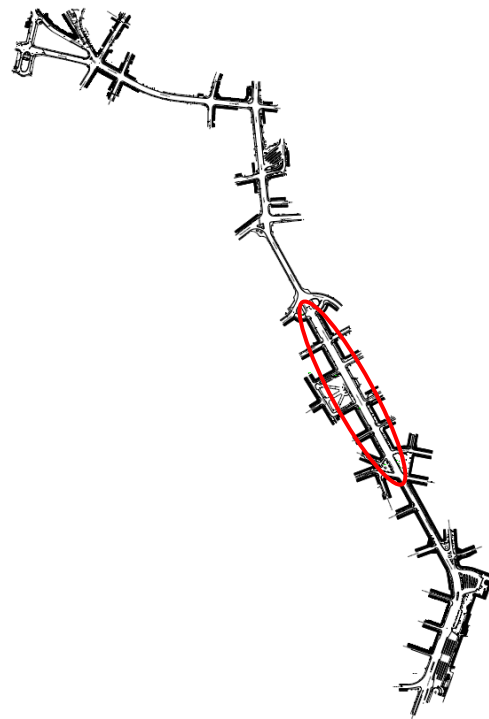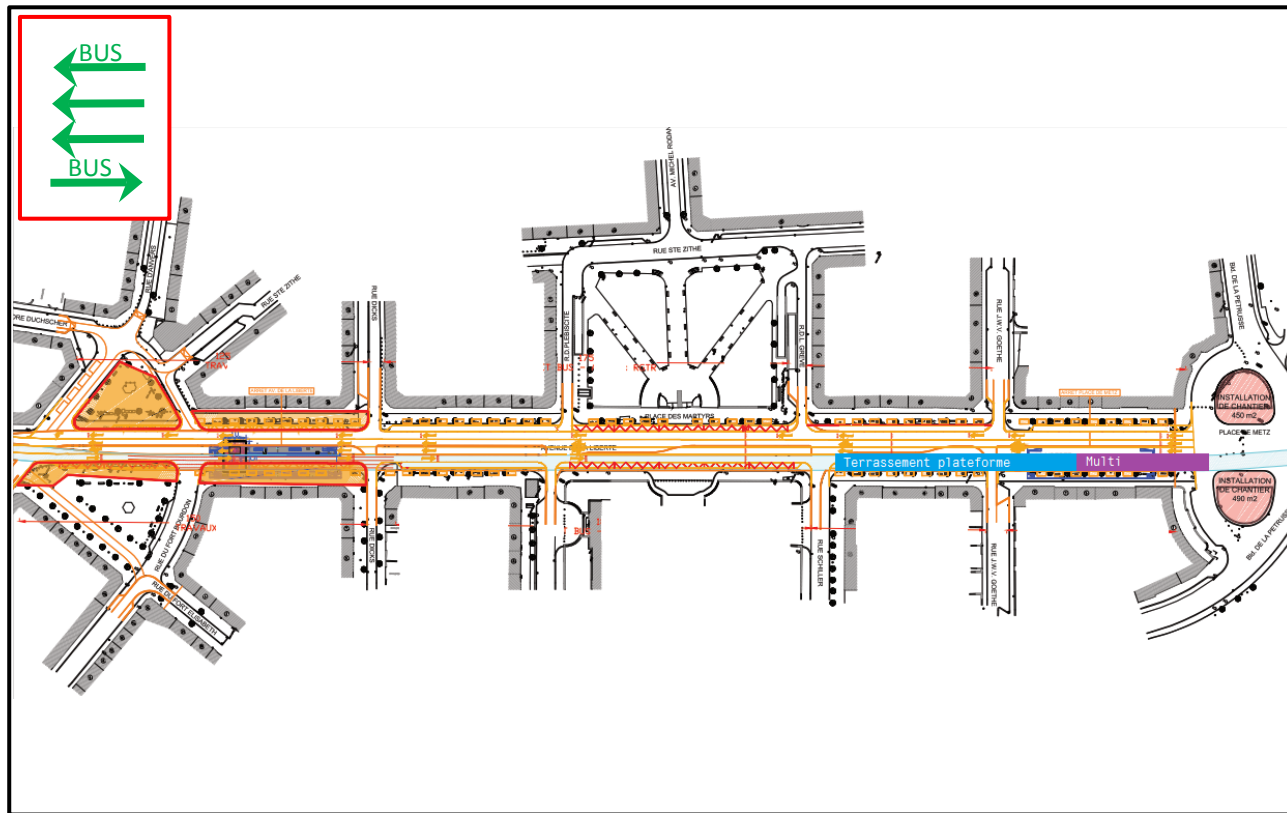

Lot 4 Place de Paris – Rue de Strasbourg

Avenue de la Liberté : Déviation des réseaux de **mi-mai** à **fin octobre**

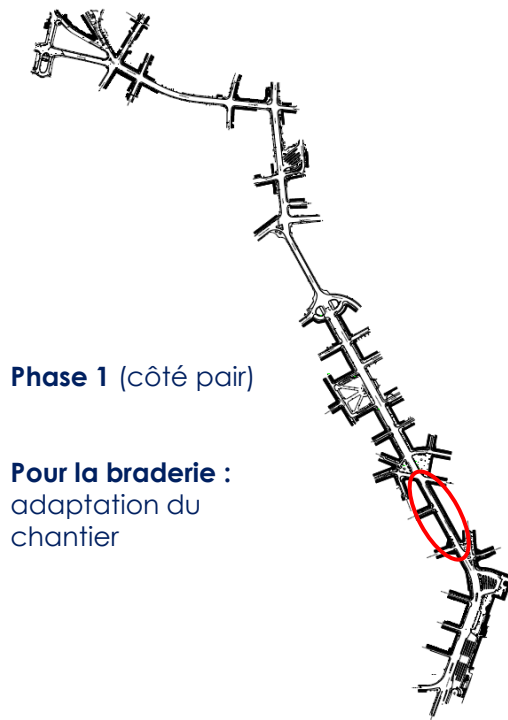
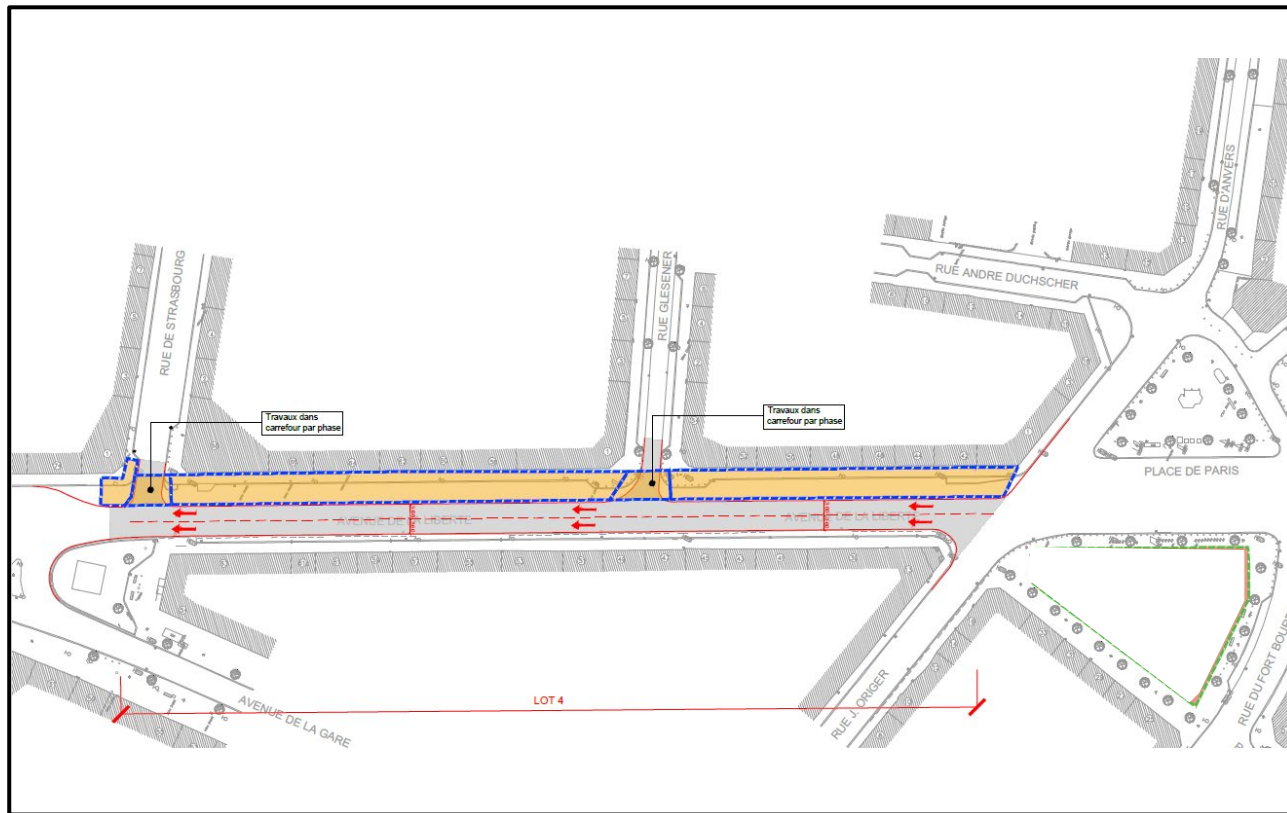


Phase 1 (côté pair)

Pour la braderie :
adaptation du
chantier

Lot 5 Rue de Strasbourg – Pl. de la Gare

Place de la Gare : Déviation des réseaux de **mi-juin** à **début septembre**

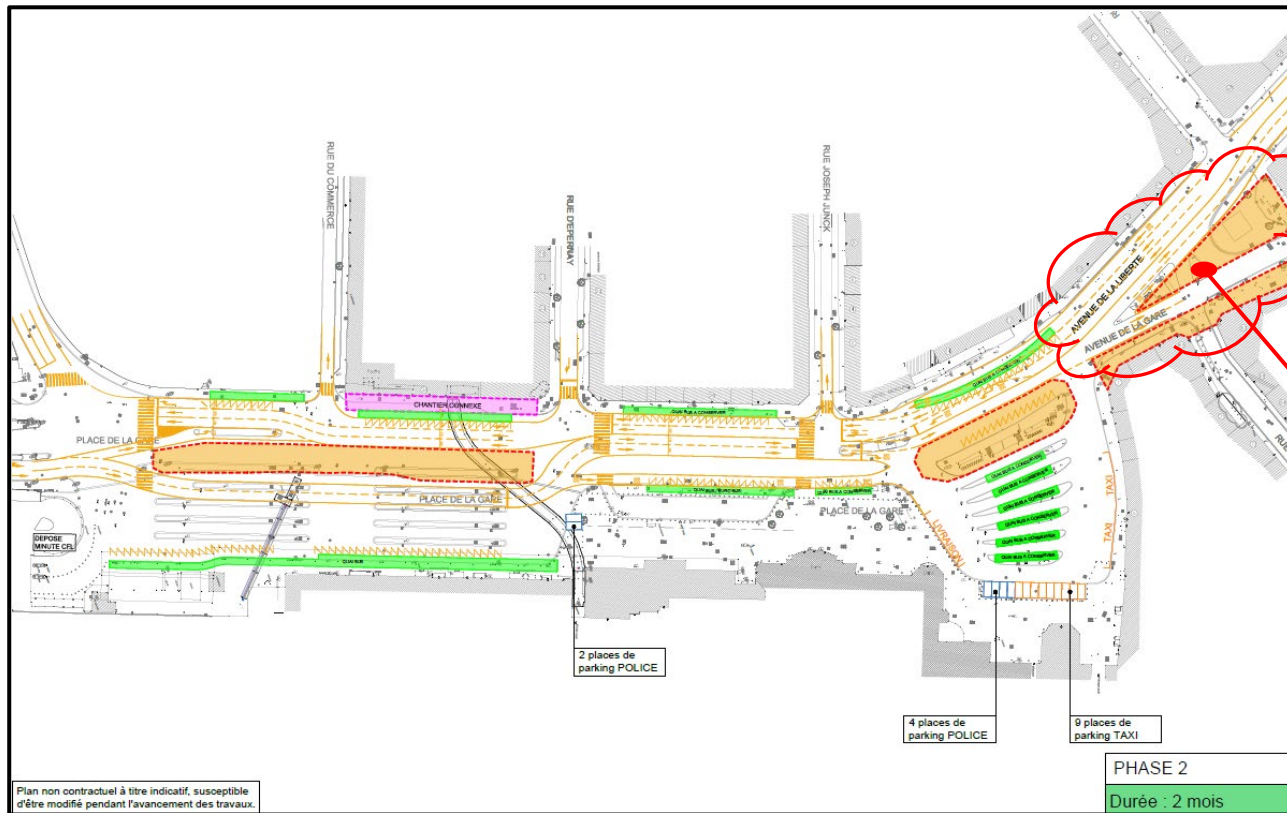

Phase 2/6


Travaux durant congés collectifs

Pour la braderie :
adaptation du
chantier



Lot 5 Rue de Strasbourg – Pl. de la Gare

Place de la Gare : Déviation des réseaux de début septembre à début octobre

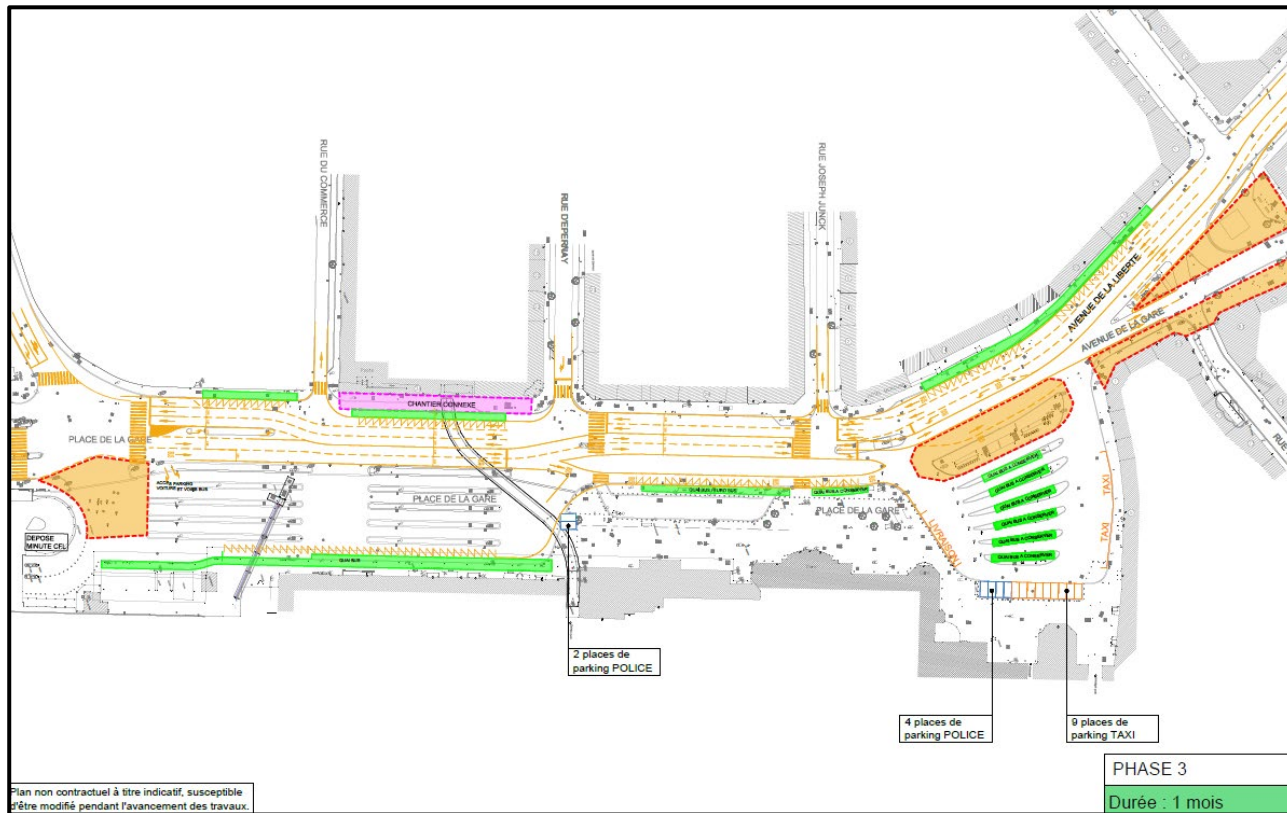

Phase 3/6

